


倉敷駅周辺第二土地区画整理事業説明会


次 第

- 1 あいさつ
- 2 職員紹介
- 3 現在の状況について
- 4 事業計画の変更及び今後の予定について
- 5 質疑応答

3 現在の状況について

-  令和5年度の施工予定箇所
-  下水工事
-  これまでの施工済み箇所

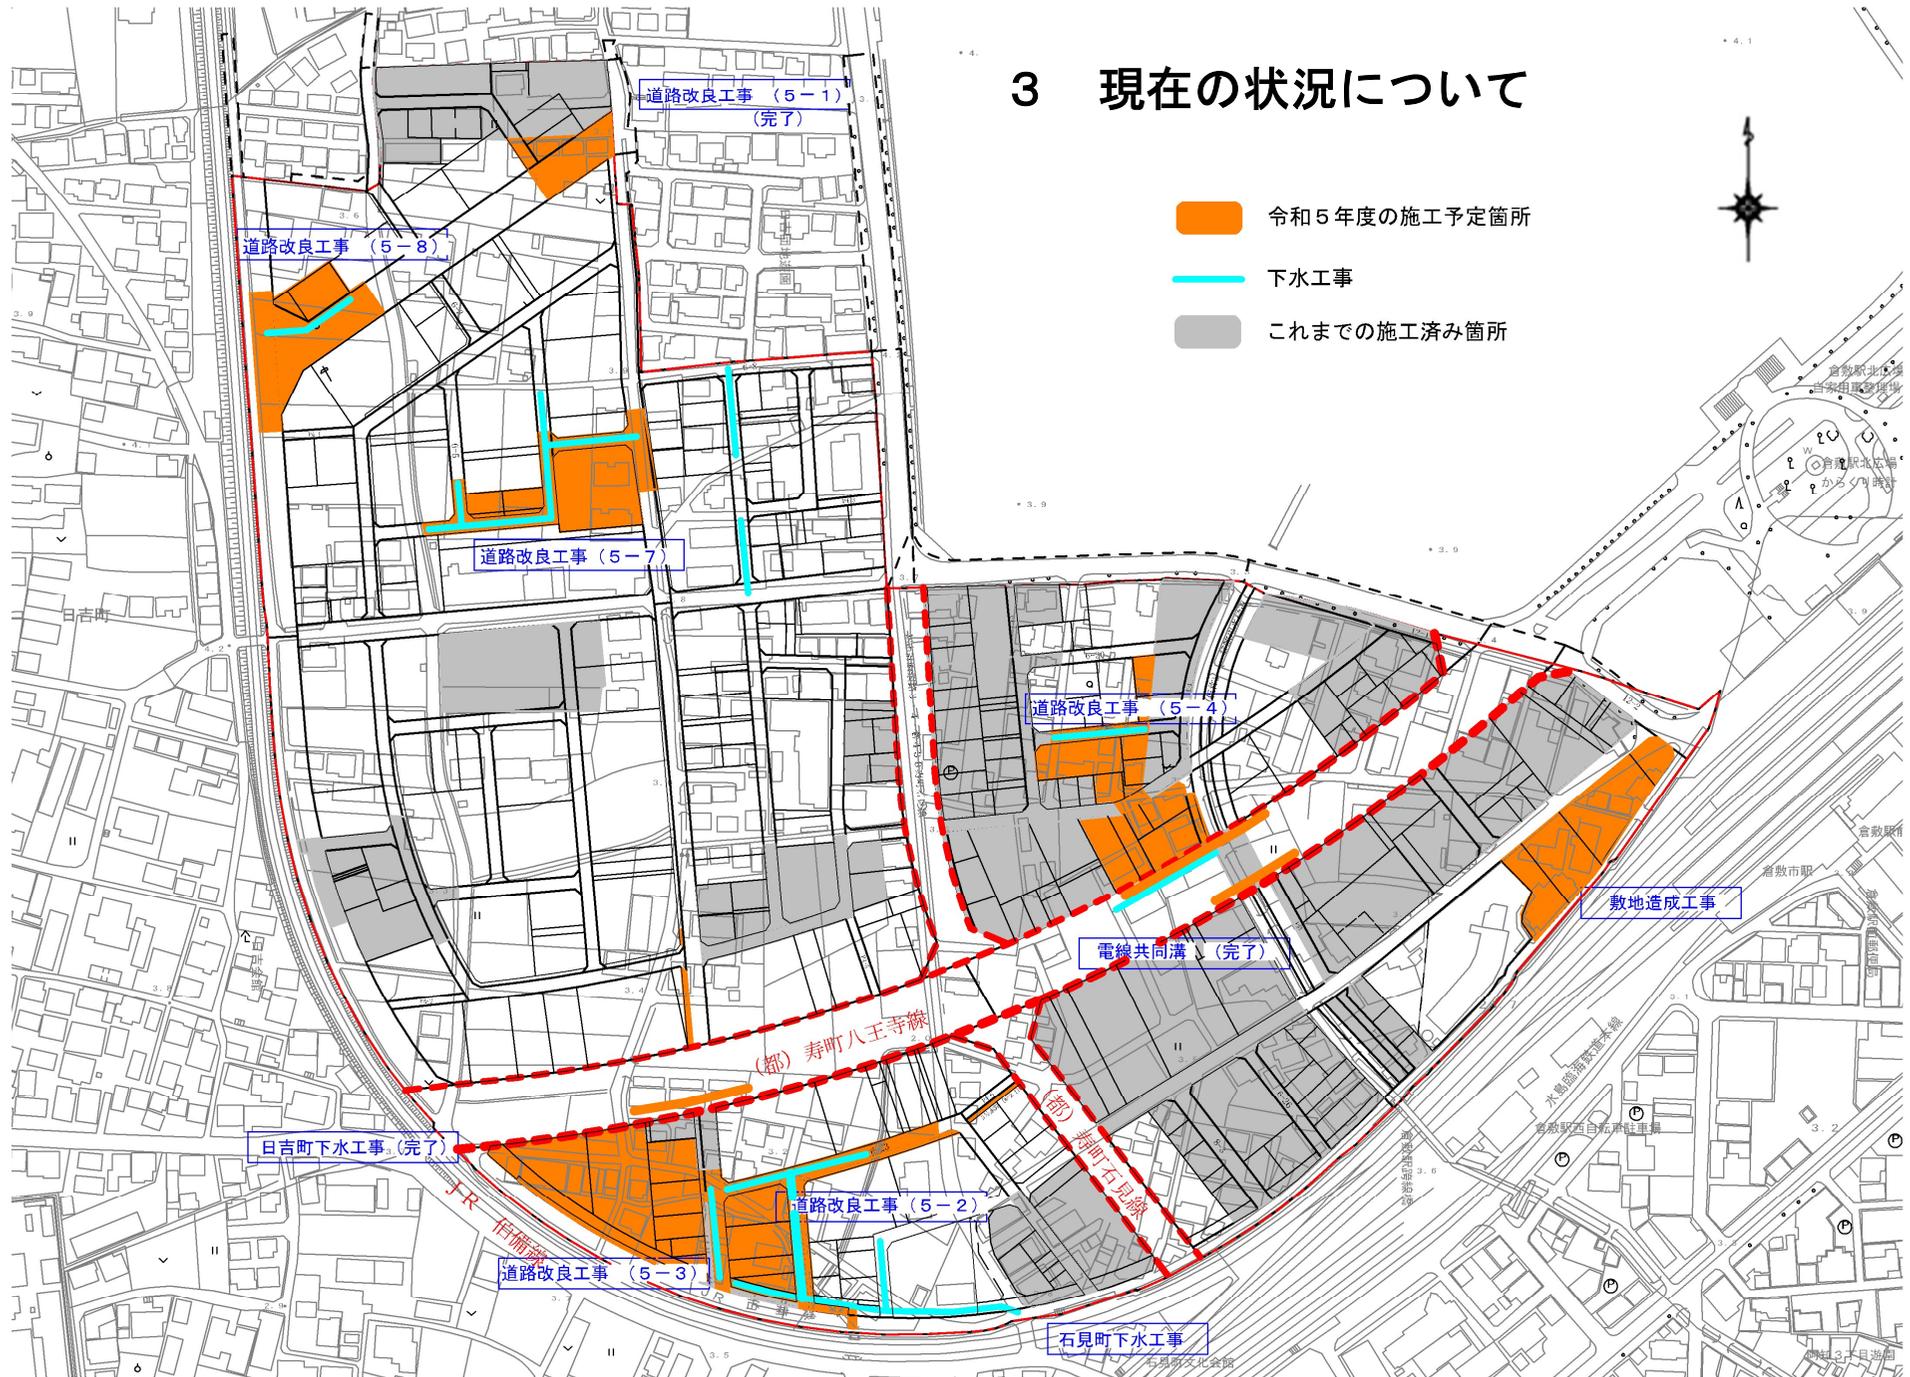

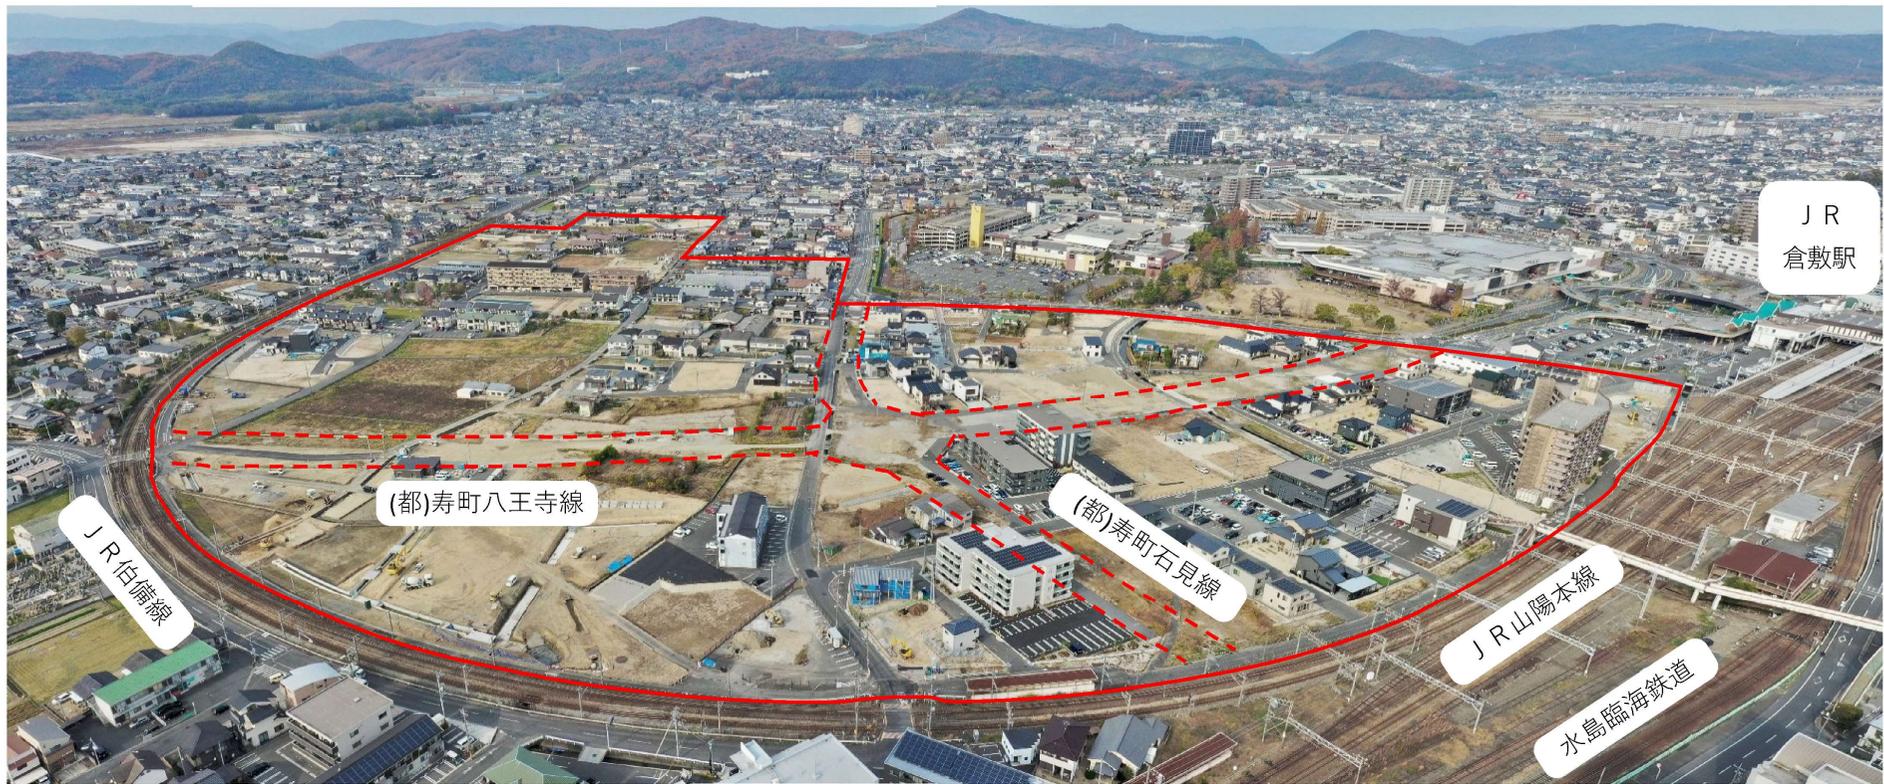

令和5（2023）年11月29日（水）撮影

4 事業計画の変更及び今後の予定について

◇変更経緯

現計画事業期間；令和12年3月31日（清算期間5カ年含む）

新型コロナウイルス感染症拡大 → **事業期間を延伸**

社会情勢の変化による物価高騰 → **総事業費を増額**

◇変更内容

①事業期間 **7年**延伸；令和11年度→**令和18年度**（清算期間5カ年含む）

理由；新型コロナウイルス感染症拡大による移転交渉の鈍化

建物移転計画の見直し

雨水貯留施設等の設置

②総事業費 **48億円**増額；総事業費約172億円→**約220億円**


理由；残事業費の見直し

過年度実績の精査

◇今後のスケジュール

- ・石見町地元説明会・・・令和6年1月20日（土）
- ・日吉町地元説明会・・・令和6年1月27日（土）、28日（日）
- ・事業計画変更公告・・・令和6年1月末予定

4 事業計画の変更及び今後の予定について

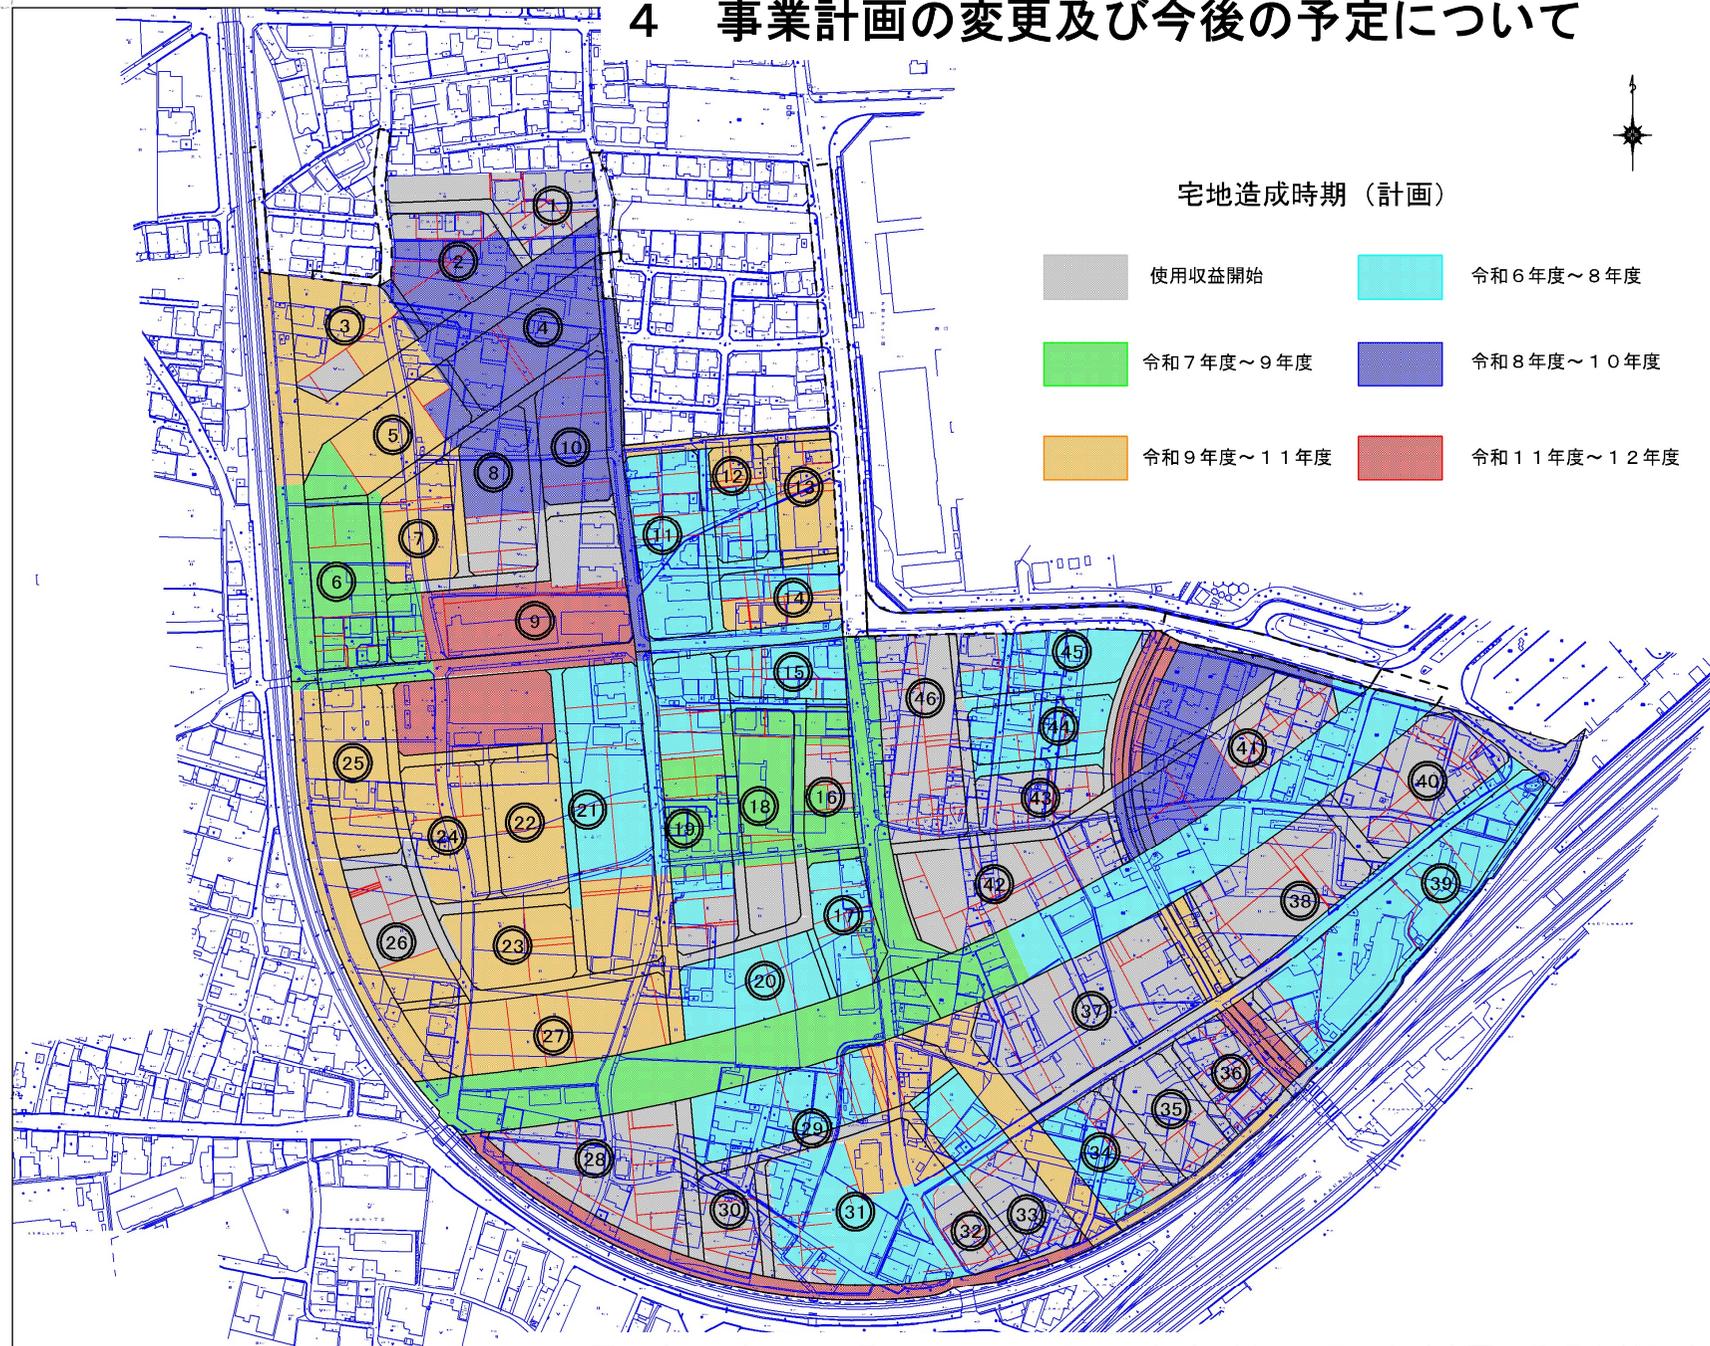

この図面は、令和6年1月31日時点のものであり、進捗状況により変更する場合があります。
